



平成23年10月施工

施工前全景



仮設工事 前面(養生ネット)



仮設工事 後面(養生ネット)

施工前の状況: 屋根部は経年による発錆、ハゼ部コーキングの劣化。  
金属サイディング部も経年劣化による白亜化、発錆が見受けられたため、早急の  
塗装改修が必要となりました。

外壁シーリング



着工前



打ち替え



打ち替え

シーリングとは、外壁の継ぎ目部分やサッシ等、隙間から雨水等が入らないようにコーキング等の  
目地材を充填する事です。経年により劣化するため、外壁塗装工事に合わせて打ち替えをします。

外壁塗装



着工前



高圧洗浄



錆止め塗布




上塗り 1回目




上塗り 2回目



外壁塗装完了

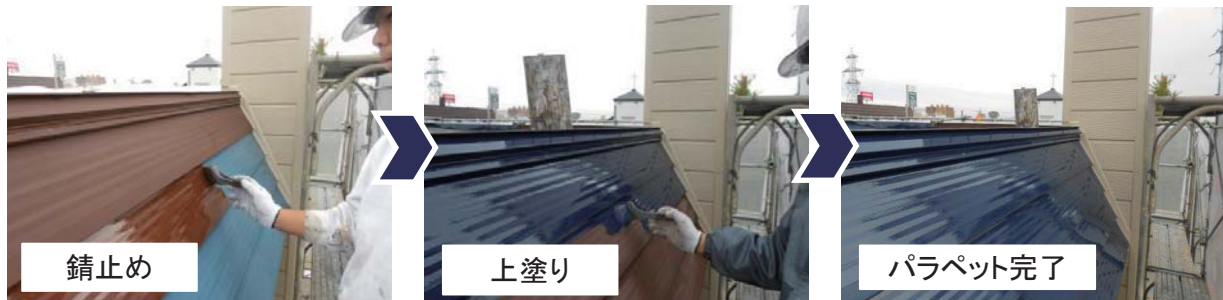

ケレン作業とは、さび落としや劣化している塗膜の除去を行うことを指します。この作業でタン表面への塗料ののりが良くなり、塗膜の寿命が長持ちします。

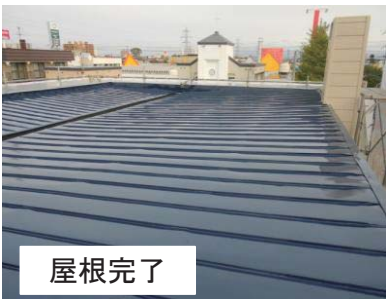

札幌塗装工業協同組合と(株)林崎塗装店の連名で保証書を発行しています。
